

## 芦屋市橋梁長寿命化修繕計画について

### 1 撤去・廃止橋梁の対策状況について

#### (1) 第一跨線橋の対策について

令和2年度より、地域やJR西日本と協議を重ねた結果、令和5年度にJR西日本と工事協定を締結し、令和6年度には撤去工事に着手する予定です。

<工事協定の概要>

期間	令和5年度～令和9年度
金額	約1,197百万円
内容	跨線橋撤去工事費、工事ヤード整備復旧費、電気工事費、建築工事費 工事監理費、積算業務費、委託事務費 など

地域との協議経過（下表参照）を踏まえ、令和6年度の工事着手までに、迂回路の安全対策（防護柵の設置や、車止めの設置など）を実施します。

撤去工事が完了した後、市有地には自転車駐車を整備する予定です。

今後のスケジュール等については、別紙1に示します。

地域との協議経過

	項目	内容
令和3年 3月	第1回説明会	老朽化対策として撤去方針を説明
令和3年11月	第2回説明会	老朽化対策として5案を整理し、撤去・迂回路対策を方針として説明
令和3年12月	迂回路点検	山手小・PTA・愛護委員会・地域・兵庫県と迂回路の安全点検を実施
令和4年 3月	第3回説明会	検討する迂回路安全対策を説明
令和5年 3月 (予定)	第4回説明会	迂回路安全対策の検討結果及び今後のスケジュールを説明予定

#### (2) クロマツ橋・ツツジ橋の対策について

河川管理者との協議を経て、地域に撤去方針であることを説明しました。

令和5年度に撤去工事を実施するため、現地に周知看板を設置します。

## 2 健全性Ⅲの橋梁の対策状況について

平成29年度及び平成30年度の定期点検において健全性Ⅲ（早期措置段階）と判定された橋梁の対策状況は以下のとおりです。（別紙2参照）

設計済の5橋のうち、第一跨線橋を除く4橋については令和5年度中に工事に着手します。

健全性Ⅲと判定された橋梁の対策状況（令和5年1月末現在）

	Ⅲ 早期措置段階	完了 (対策済)	工事中	設計済
現状	21橋	9橋	7橋	5橋

## 3 今後の橋梁長寿命化修繕計画について

令和4年度及び令和5年度に実施する定期点検の結果に基づき、令和6年度に橋梁長寿命化修繕計画の見直しを実施します。

## 4 添付資料


別紙1 第一跨線橋対策の今後のスケジュール等

別紙2 健全性Ⅲ（早期措置段階）の橋梁対策状況


■ 第一跨線橋 計画工程表

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
第一跨線橋	跨線橋撤去設計		● 工事協定	跨線橋 撤去工事				● 用地整理
				● 通行止			● 市道廃止	
関連事業		迂回路対策設計	迂回路対策工事					駐輪場工事

■ 第一跨線橋付近 現況図

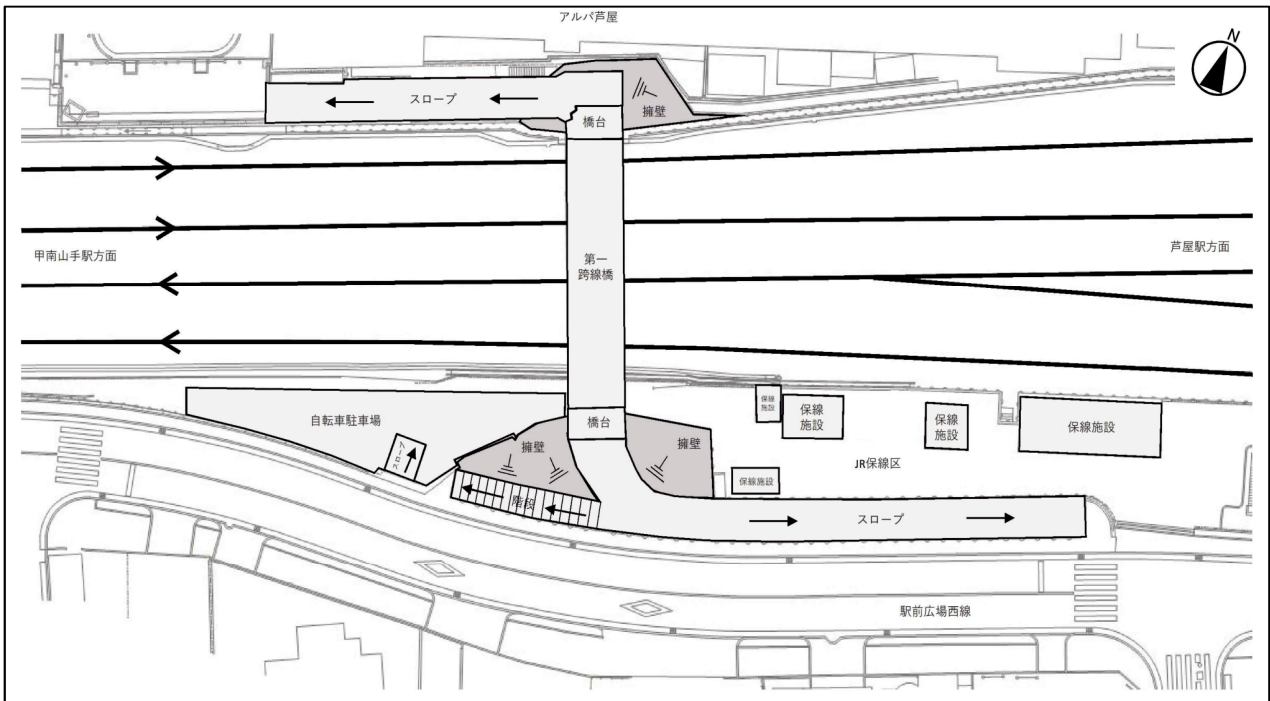


■ 第一跨線橋付近 将来図(撤去後)

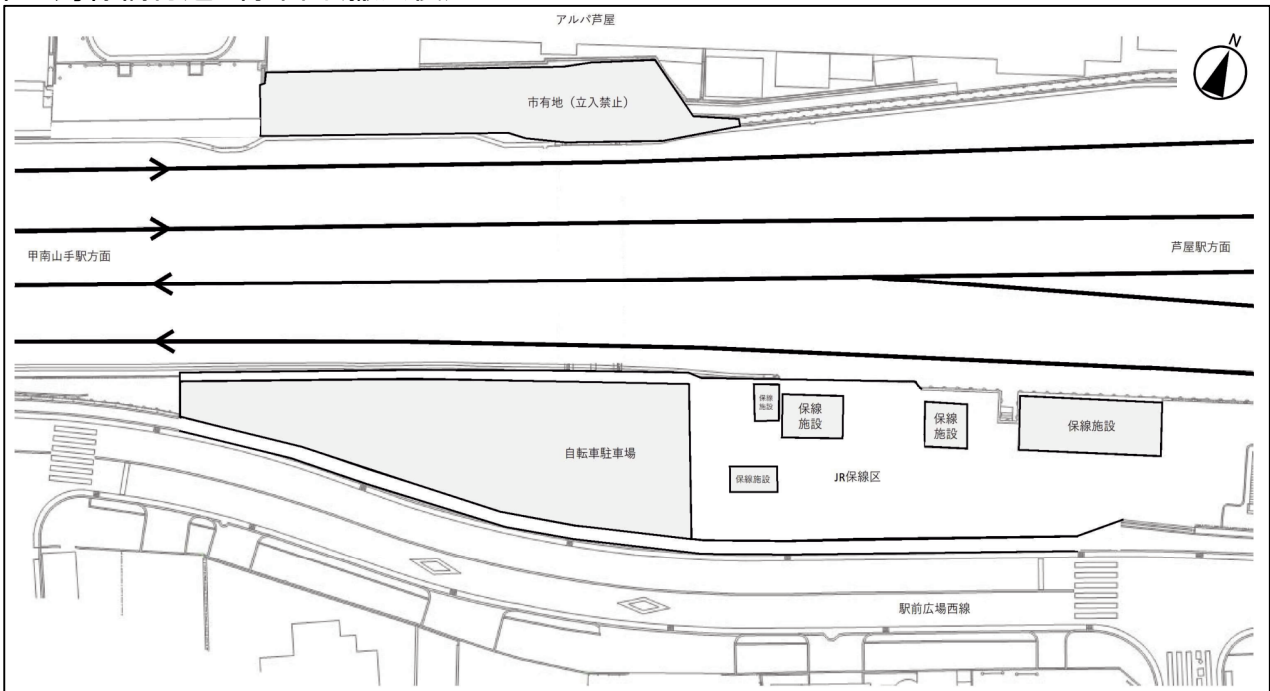

定期点検結果（健全性Ⅲ） 一覧表

No.	道路橋名	路線名	架設年次 (西暦)	橋長	幅員	橋梁毎の 健全性診断	対策方針	対策状況
1	奥池橋	市道700号線	1970年	7.30	15.00	Ⅲ	修繕	工事中
2	奥山橋	市道748-1号線	1970年	9.57	12.25	Ⅲ	修繕	工事中
3	赤池橋	市道722号線	1973年	5.70	9.25	Ⅲ	修繕	工事中
4	桜橋	市道381-1号線	1958年	22.11	6.60	Ⅲ	修繕	令和5年度 修繕工事予定
5	月若橋	市道367号線	1968年	22.40	10.60	Ⅲ	修繕	完了
6	大正橋	市道359号線	1991年	27.10	15.00	Ⅲ	修繕	完了
7	朝日ヶ丘第5橋	市道502号線	1964年	2.50	32.30	Ⅲ	修繕	完了
8	朝日ヶ丘第6橋	市道506号線	1966年	3.40	37.90	Ⅲ	修繕	工事中
9	八十塚橋	市道143号線	1931年	5.65	9.95	Ⅲ	修繕	工事中
10	親王塚橋	山手幹線	2005年	8.90	22.80	Ⅲ	修繕	完了
11	宮塚橋	市道338-1号線	1971年	23.71	15.56	Ⅲ	監視	完了
12	汐風橋	防潮堤線	1980年	21.13	24.99	Ⅲ	修繕	工事中
13	汐見橋	宮川南芦屋浜線	1979年	34.60	3.10	Ⅲ	修繕	工事中
14	浜風大橋	打出浜線	1995年	190.00	22.00	Ⅲ	修繕	完了
15	芦屋浜線歩道橋	芦屋浜線	1977年	24.90	3.80	Ⅲ	架替	完了
16	若潮歩道橋	芦屋浜1号線	1978年	47.00	1.90	Ⅲ	修繕	完了
17	阪神芦屋駅南歩道橋	市道216号線	1994年	67.03	2.80	Ⅲ	修繕	令和5年度 修繕工事予定
18	打出浜線西歩道歩道橋1	打出浜線	1978年	28.07	3.60	Ⅲ	修繕	完了
19	ツツジ橋	市道216号線	1961年	13.90	1.20	Ⅲ	撤去・廃止	令和5年度 撤去工事予定
20	クロマツ橋	市道216号線	1961年	14.60	1.20	Ⅲ	撤去・廃止	令和5年度 撤去工事予定
21	第一跨線橋	市道196号線	1926年	43.33	5.31	Ⅲ	撤去・廃止	設計済

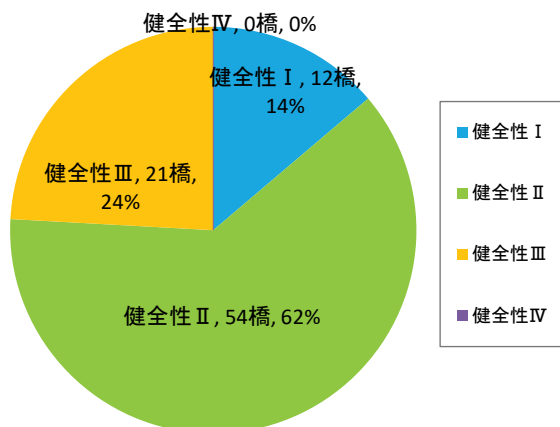

健全性診断	数量	割合
健全性Ⅰ	12橋	14%
健全性Ⅱ	54橋	62%
健全性Ⅲ	21橋	24%
健全性Ⅳ	0橋	0%
87橋		
